



INFORME DE LABORES DEL 17 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2018

De las labores ejecutadas por el personal a cargo de esta Unidad se han desarrollado las siguientes actividades como gestión para la mejora de la Red Vial.

- Se concluyen labores de colocación de mezcla asfáltica en caliente con personal propio entre súper Ángela y Colegio las Américas.
- Se mantienen obras de canalización en el sector de calle la Rejoja el cual se lleva a cabo de forma conjunta con la Municipalidad de Santo Domingo, las obras consisten en la sustitución de tubería, construcción de pozos, y construcción de un sistema de canalización superficial las obras abarcan una longitud total de 75 metros.
- Se asiste al Concejo Municipal a fin de aclarar una serie de consultas del proceso de colocación del Tratamiento Superficial Bituminoso de tres capas en el sector de la Trinidad, para lo cual se lleva a cabo una presentación de los diferentes sistemas existentes a nivel mundial.
- Se procede a convocar las diferentes reuniones de pre construcción tal y como lo establece el CR-2010, a fin de poder concluir algunas de las contrataciones en su fase ejecutoria.
- Se da inicio a los proceso de canalización de los Calle Manantial y Calle los Conejos, los avances son significativos para el periodo de ejecución plasmado por el contratista.
- Se lleva a cabo colocación de mezcla asfáltica en caliente sobre tapas de pozos de alcantarillado pluvial y de algunos baches que presentan afectación de tránsito.
- Se lleva a cabo la ejecución de proyectos en forma conjunta con la comunidad de la Isla, en los sectores de calle la huesera y en la parte posterior de Lomas, en los códigos de camino 090 y 086. La mano de obra es aportada por los vecinos y los materiales por el municipio. Las obras desarrolladas se fundamentas en la mejora de la canalización pluvial.



**UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-
INFORME TECNICO DE INSPECCION
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105



Imagen 1 Reparación salida lomas de Cabeara a terminal AMSA



Imagen 2 Mejora de la capa base en Lomas de Cabeara



Imagen 3 Demarcación vertical Calle La Torre



Imagen 4 Señal vertical entronque Calle Nueva y Calle La Torre



Imagen 5 Colocación de MAC en la salida de Lomas de Cabeara

Hagamos de Moravia una verdadera comunidad



**.UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-
INFORME TECNICO DE INSPECCION
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105



Imagen 6 Colocación de MAC en la salida de Lomas de Cabeara



Imagen 7 Colocación de MAC en la salida de Lomas de Cabeara

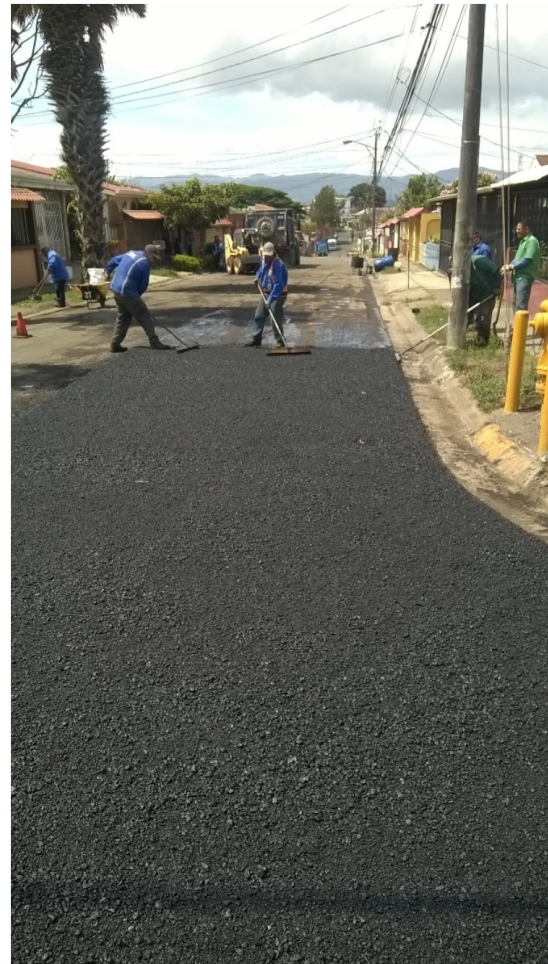


Imagen 8 Inicio de obras de recarpeteo Colegio las Américas hasta súper Ángela

**Ing. Manrique Martínez
Blanco**

Director UTGV Municipalidad de
Moravia

e-mail:

mmartinez@moravia.go.cr

Hagamos de Moravia una verdadera comunidad
